


# Sanierung der Schloßstraße, 1. BA Baustand


# Regenwasserableitung Rennenbach

## Bereich oberhalb Schloßstraße

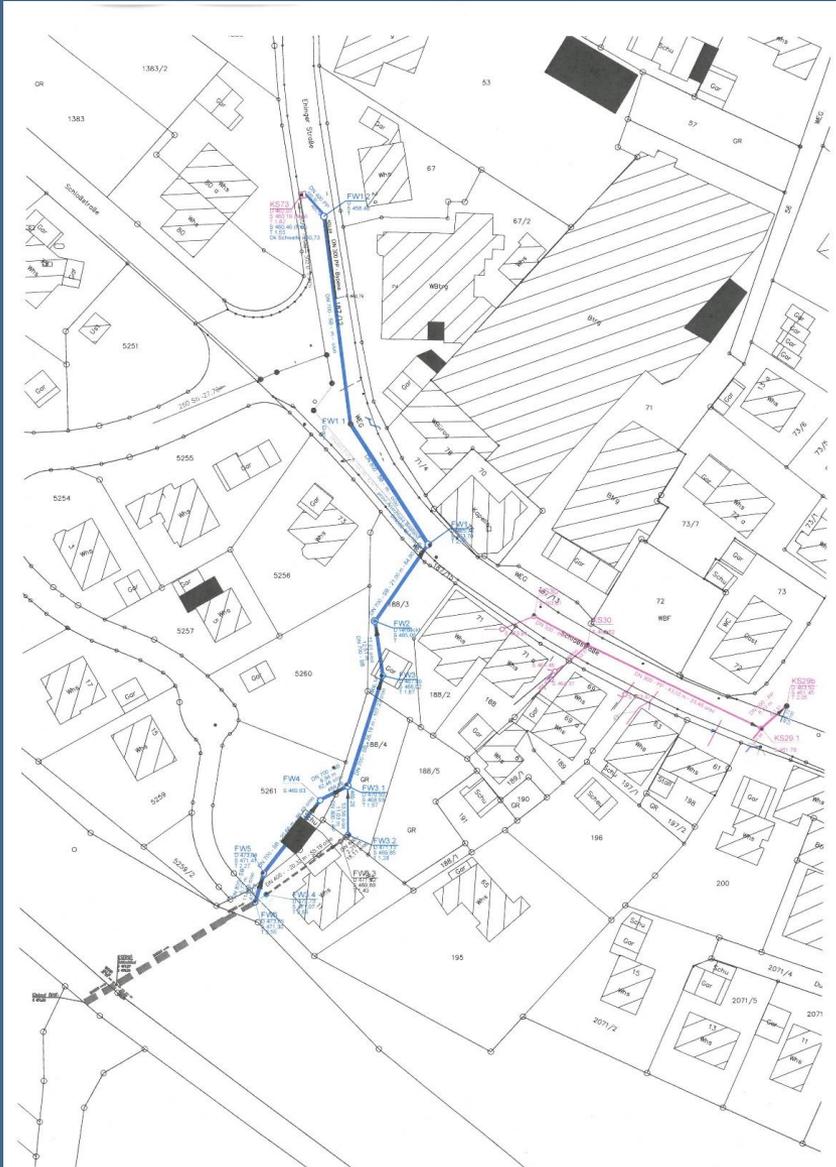

# Regenwasserableitung Mägdebergtobel

## Bereich Kreuzung Schmiedstraße / Schloßstraße

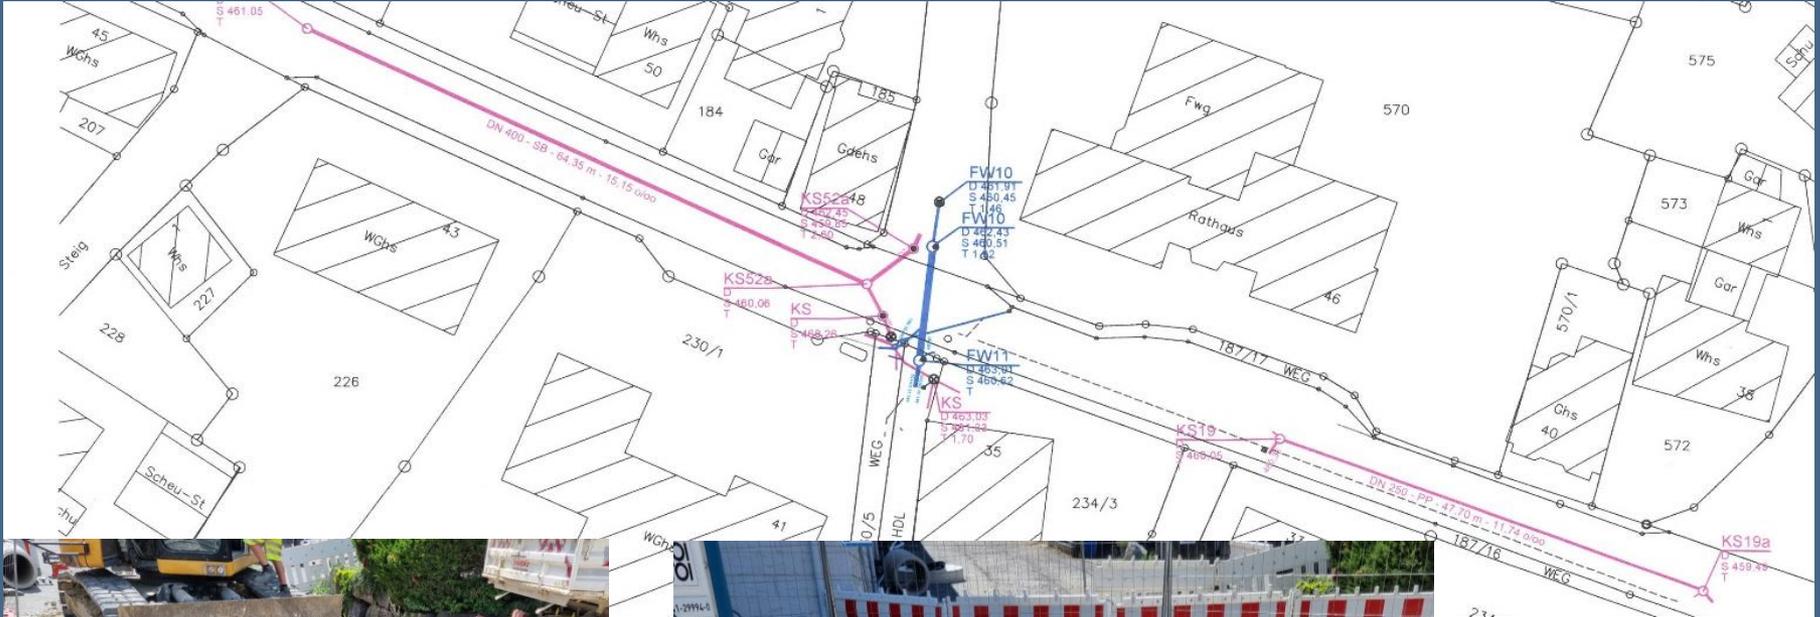

# Wasserversorgung

## Bereich Kreuzung Schmiedstraße / Schloßstraße

Aufbau einer Notversorgung für die



Abbruch vorh. Wasserleitungsschacht




# Wasserversorgung

## Bereich Kreuzung Schmiedstraße / Schloßstraße



# Wasserversorgung

## Bereich Kreuzung Schmiedstraße / Schloßstraße

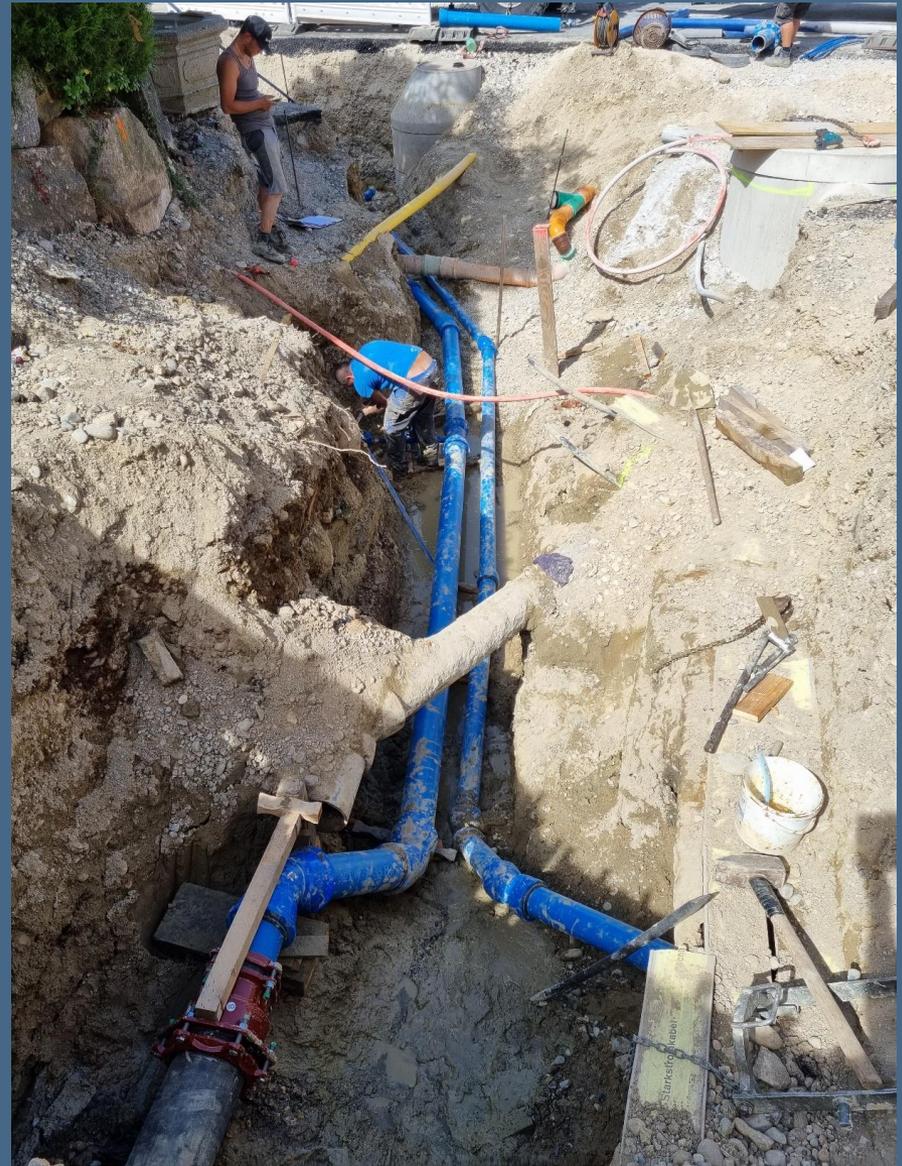

# Kanalisation

## Bereich Schmiedstraße bis Duchtlinger Steig



# Kanalisation

## Bereich Schule



# Straßenbau

## Bereich Löwen bis Ehinger Straße



Gehwege und Hofangleichungen sind weitgehend hergestellt;  
Die Bituangleichungsarbeiten sind derzeit noch offen; u.U. ab Mitte nächste Woche



Barrierefreier Zugang zur Kapelle

## Bereich Löwen bis Ehinger Straße



Erneuerung der Querungshilfe mit  
taktilem Leitsystem

# Straßenbau

## Bereich Rathaus

Für Gehwege in der Ortsmitte:  
Betonpflaster Typ City Truck, Fa. Kronimus  
Wilder Verband 18/12 und 18/24

cm



# Straßenbau

## Bereich Rathaus



# Straßenbau

## Bereich zwischen Schmiedstraße und Bahnhofstraße

Fräsen unbelastete Bereiche



# Kostensituation

## Projekt: Ausbau der OD Mühlhausen, 1. BA

Auftraggeber: Gemeinde Mühlhausen-Ehingen

### Aufstellung Mehrkosten

Stand 19.09.2022

	netto	brutto
<b>Kanalisation</b>		
Erschwernisse Ableitung Mägdbertobel z.B. durch vorh. Leitungen, Kabel, Abbruch vorh. Schacht; Umbau neuer Sc	11.000,00 €	13.090,00 €
	<u>11.000,00 €</u>	<u>13.090,00 €</u>
<b>Wasserversorgung</b>		
zusätzliche Notversorgung (Mail 09.05.22)	8.000,00 €	9.520,00 €
Aufwand für Suchen der Leitungen 06.22	2.500,00 €	2.975,00 €
Aufwand für Rohrbrüche 04. - 05.22	2.500,00 €	2.975,00 €
Stichleitung Richtung Alemannenstraße	14.000,00 €	16.660,00 €
Kopflöcher und Notversorgung Duchtlinger Steig	8.000,00 €	9.520,00 €
Anschluss Duchtlinger Steig (30 m)	12.000,00 €	14.280,00 €
Änderung WV Bereich westlich Adler	10.000,00 €	11.900,00 €
	<u>57.000,00 €</u>	<u>67.830,00 €</u>
<b>Straßenbau Gemeinde</b>		
NA 1 Pflaster zweifarbig	3.835,70 €	4.564,48 €
NA 3 Mauerscheiben sandgestrahlt	1.413,80 €	1.682,42 €
Untergrundverbesserung Alemannenstraße	12.400,00 €	14.756,00 €
L-Steine nördlich Schultreppe und Anpassung L-Steine südlich Schultreppe	8.400,00 €	9.996,00 €
Erschwernisse Betonabbruch u.a.	6.000,00 €	7.140,00 €
Anpassung L-Steine südlich Schultreppe	8.400,00 €	9.996,00 €
	<u>40.449,50 €</u>	<u>48.134,91 €</u>

### **Straßenbau Landkreis**

Belastetes Material (Schreiben vom 12.04.22)  
aus den ersten beiden Abschnitten  
zu erwarten aus 3. und 4. Abschnitt  
Untergrundverbesserung vor Rathaus

Ferner steht im Raum:

Anmeldung von Mehrkosten wegen:  
- Material- und Energiekostensteigerungen  
- drohenden Behinderungen aufgrund von Materiallieferengpässen  
wegen des Ukraine-Krieges

Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!
